BRØNDBORER-BORERAPPORT DGU arkivnr: 201.11663
Lokal nr:

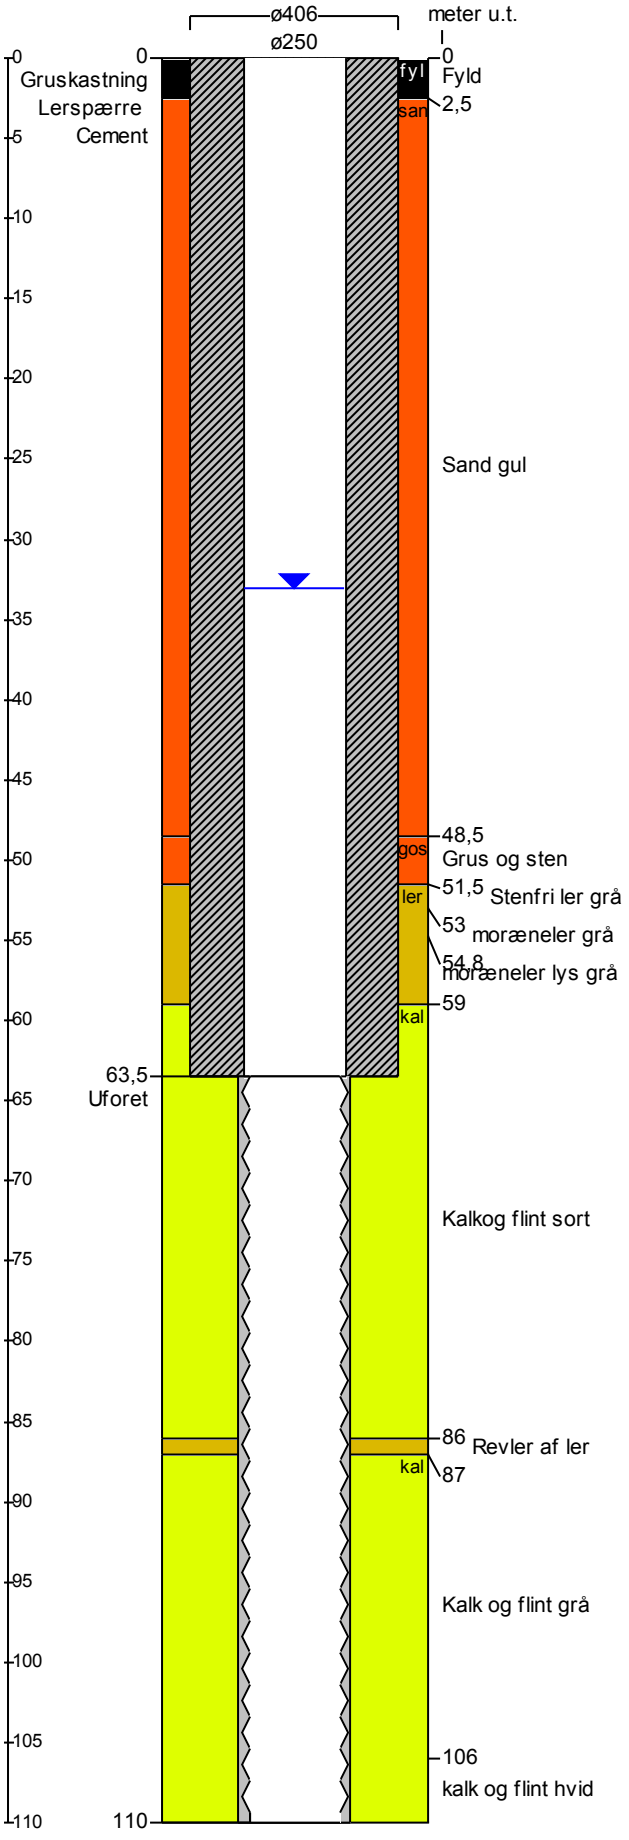

Rekvirent : Lyngby-Taarbæk Forsyning
Borested : Trongårdsvej 44
UTM-koord. : 6187306, 721615, zone 32
Boringsdato : 4/6 2017
Brøndborer : Thomas Brøker, Holbæk
BB-journr : 17090
Terrænkote : 41,82 meter o. DNN
Formål : Vandværksboring
Boremetode : Indirekte skyllebor

Dimension : 406 mm til 63,5 m
220 mm til 110 m

Udbygning :
0-63,5 m: 250mm pvc (9,60000038146973mm)
Limet muffesamling
63,5-110 m: 220mm uforet,

Vandstand og Ydelse :
Vandstand i ro 33,1 meter u.t. 5/5 2017
35 m³/t ved 4,43 m. sænkning efter 2 time(r)

Transmissivitet og Virkningsgrad :
Transmissivitet : 2,10E-3
Virkningsgrad : 150%

BB Firma : Brøndboringsfirmaet Brøker
Adresse : Spånnebæk 7, 4300 Holbæk
Telefon : 59 44 04 06
Fax : 59 44 69 00
E-mail : thomas@broeker.dk
